



सुनवर्षी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

प.सं. २०७९/८०

च.नं. २२९

डाङ्गिमा, मोरङ



प्रदेश नं. १, नेपाल

मिति: २०७९/०५/२६

श्री संघिय मागिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल
स्थानीय पूर्वाधार विभाग, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम,
श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर।

विषय: प्रगति विवरण पठाएको बारे।

महोदय,

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको च. नं. १ अनुसार यस सुनवर्षी नगरपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवनको आ.व. २०७६।७७ देखी हालसम्मको प्रगति विवरण र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको भवनको फोटो हरको छायाँ प्रति १ कपी यसै पत्र साथ पठाएको व्यहोरा अनुरोध छ।

रुद्र प्रसाद दुलाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"सुशासन र सम्वृद्धि, सुनवर्षीको आधार: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र दिगो पुर्वाधार"

फोन: ०२९-४३३०२५ (नगरप्रमुख) ०२९-४३३०२६ (नगर उपप्रमुख) वेबसाइट: www.sunawarshimun.gov.np ईमेल: sunbarsimun@gmail.com



मुनबर्षी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
डाउनुनिया, मोरङ
१ नं. प्रदेश

स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रबन्ध पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण हो

म.उ.मि.न.

२६४०११११

१ स्थानीय तहको नाम:-

२ स्थानीय तहको कोड:-

३ स्थितता:-

४ लागत अनुमान (रु.)

५ प्रशासकीय प्रबन्ध निर्माणको हाल सम्मको प्रगति:-

६ निर्माण व्यवसायीको नाम, ठेगाना:-

७ ठेकाको मूल सम्झौता रकम (रु.)

८ भेरिएसन भएको भए सो सहितको सम्झौता रकम (रु.):-

९ सम्झौता मिति:-

१० सम्पन्न हुने मिति:-

११ म्याद पत्र सहित सम्पन्न हुने मिति:-

१२ प्रशासकीय प्रबन्धको लागि हालसम्म विनियोजित रकम र खर्च विवरण (भौतिका आधारमा)

आ.न.	उ.पो.आ.		प्रदेश		वि.सू.स.		संघ (स्थानीय पूर्वाधार विकास)		स्थानीय तह		(रकम रु. हजारमा)	
	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च
२०६६-७७			१००००	१००००					२२००	२२००	१२१००	१२१००
२०७७-७८					१००००	८०७६			२२२३	२२२३	१२२२३	१२२२३
२०७८-७९					२८७६	३८७६			११०१	११०१	११०१	११०१
२०७९-८०												
बम्मा	०	०	१००००	१००००	१३८७६	११९२३	०	०	१२३२४	१२३२४	३६०००	३६०००

१३ हाल सम्मको कुल खर्च रकम (रु.):-

१४ हाल सम्मको कुल बित्तिय प्रगति(प्रतिशतमा):-

१५ हाल सम्मको कुल भौतिक प्रगति(प्रतिशतमा):-

१६ आ.न. ०७९/८० मा खर्च हुने कुल बजेट(रु.):-

१७ आ.न. ०७९/८० मा खर्च हुने मध्ये संपादित आवरणक पर्ने बजेट(रु.):-

१८ आ.न. ०७९/८० मा सम्पन्न हुने/नहुने:-

वैकल्पिक (अन्य कुनै विवरण प्रस्तावित गर्ने भएमा)।

मुगासुन र सम्बन्धित, मुनबर्षीको आणाट, कुपि, सिता, स्वाम्य र दिगो पूर्वाधार

फोन: ०२१-४३३०२२ (मार्गमुल) ०२१-४३३०२२ (मार्ग उन्नयन) वेबसाइट: www.munbarshi.gov.np ईमेल: munbarshi@nps.gov.np

म.उ.मि.न.

मुनबर्षी नगरपालिका

9/12/22, 1:59 PM

知

नगर पंचायत
हस्तशिल्प
१ नं. प्रमो. नजल

七


12



<https://mail.google.com/mail/u/#inbox/Ktbx|thoDQOQfENvQm1K4dcCzDnG4Nt0I2m0w|c=1&messagePartId=0.1>

IMG_20220612_123155.jpg

9/12/22, 1:59 PM

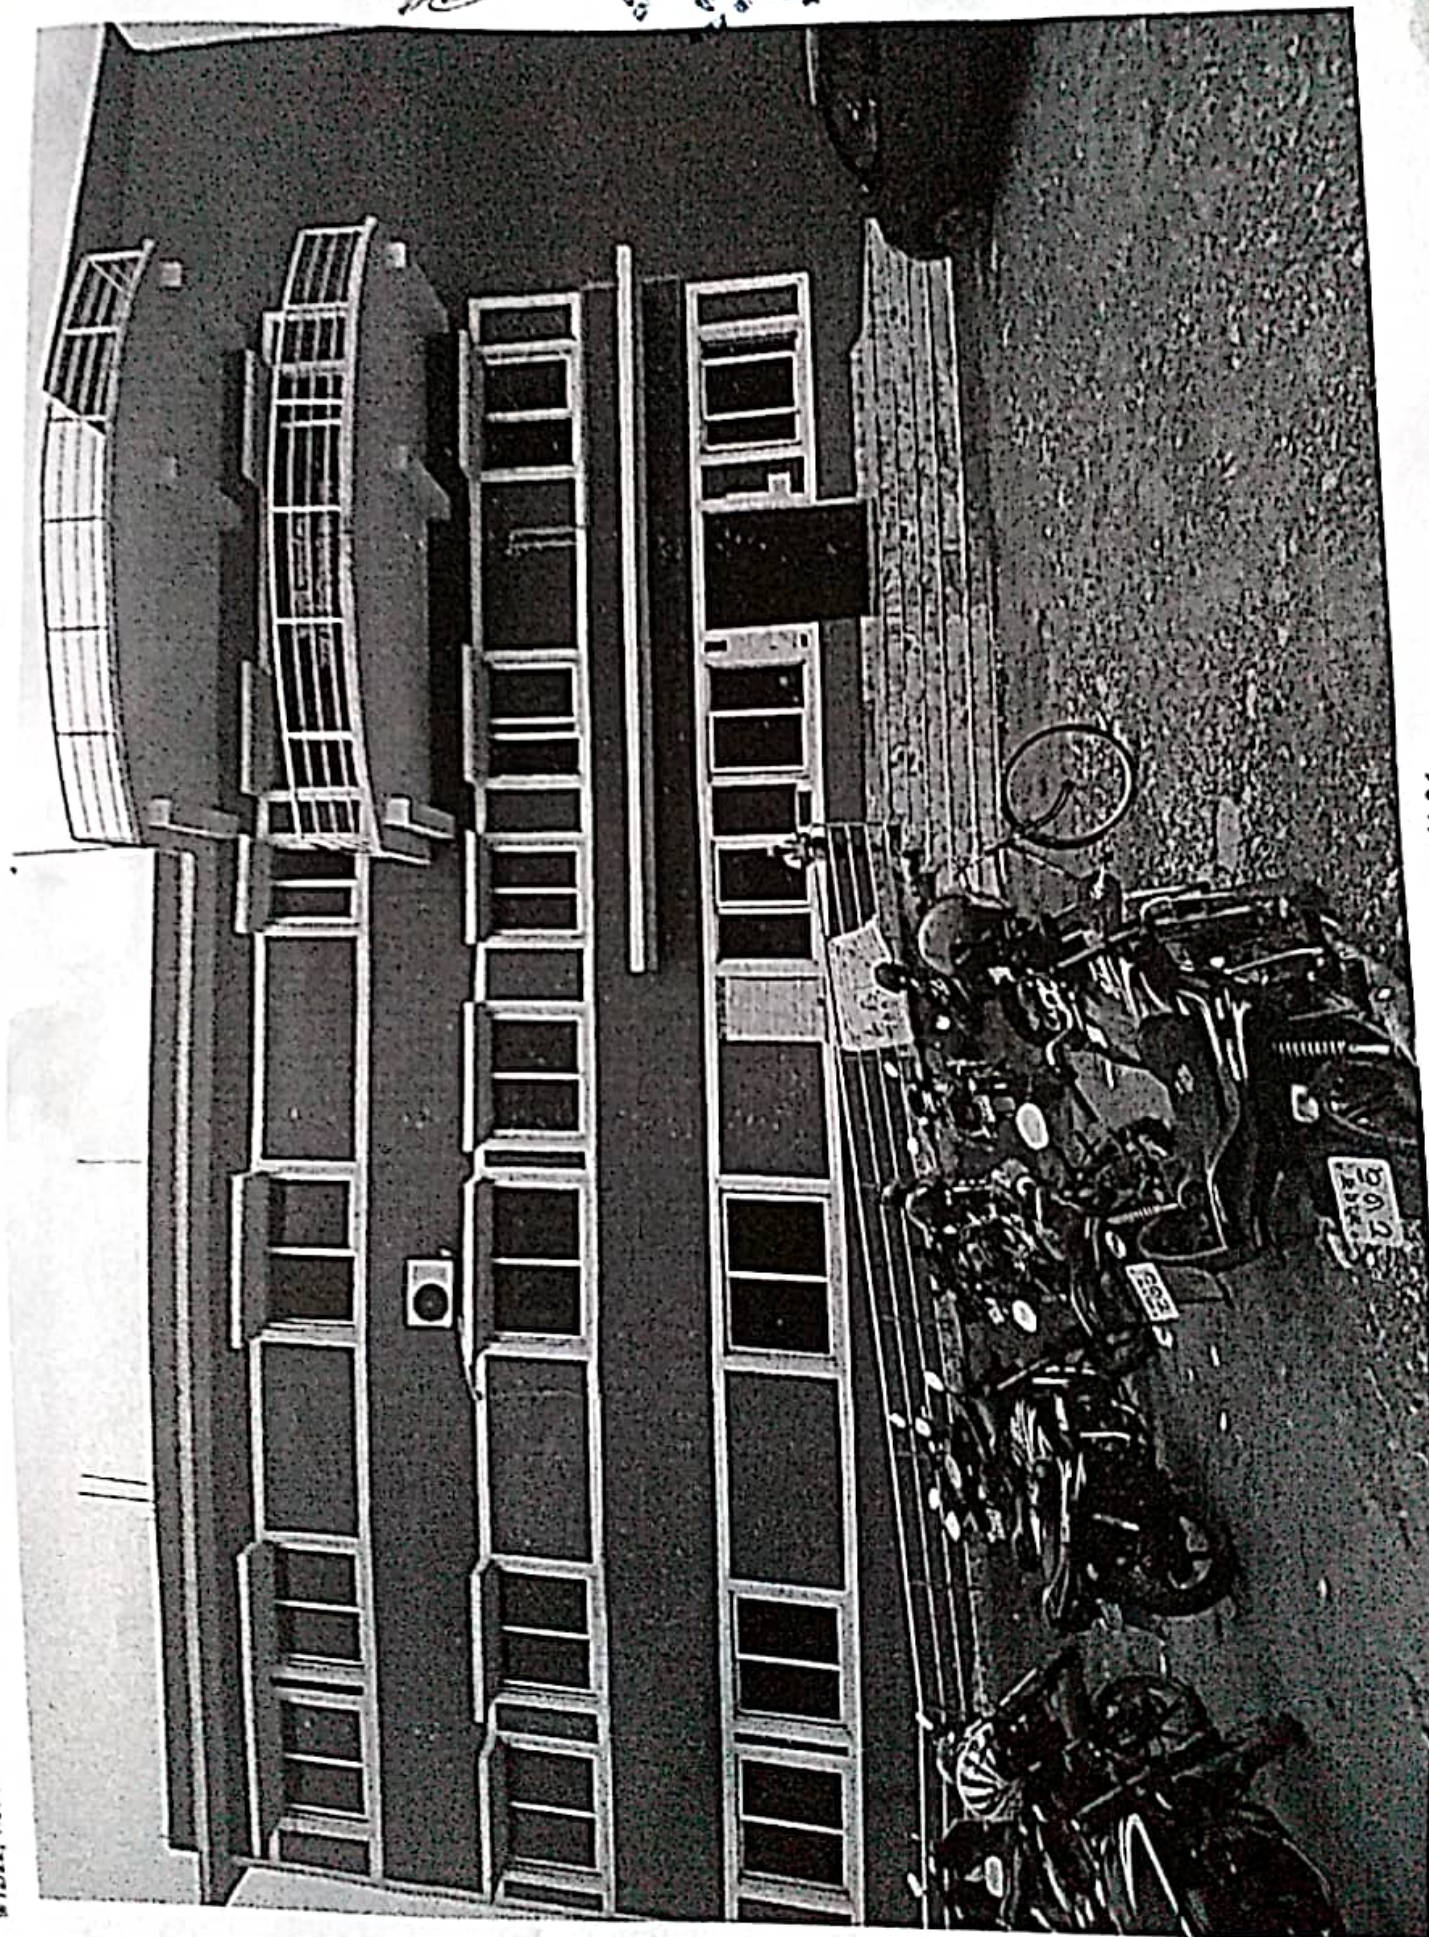


Handwritten signature and official stamp of the Ministry of the Interior, Republic of Turkey, Istanbul.


Handwritten number 12.


12

Handwritten text: 1. Üst Kat

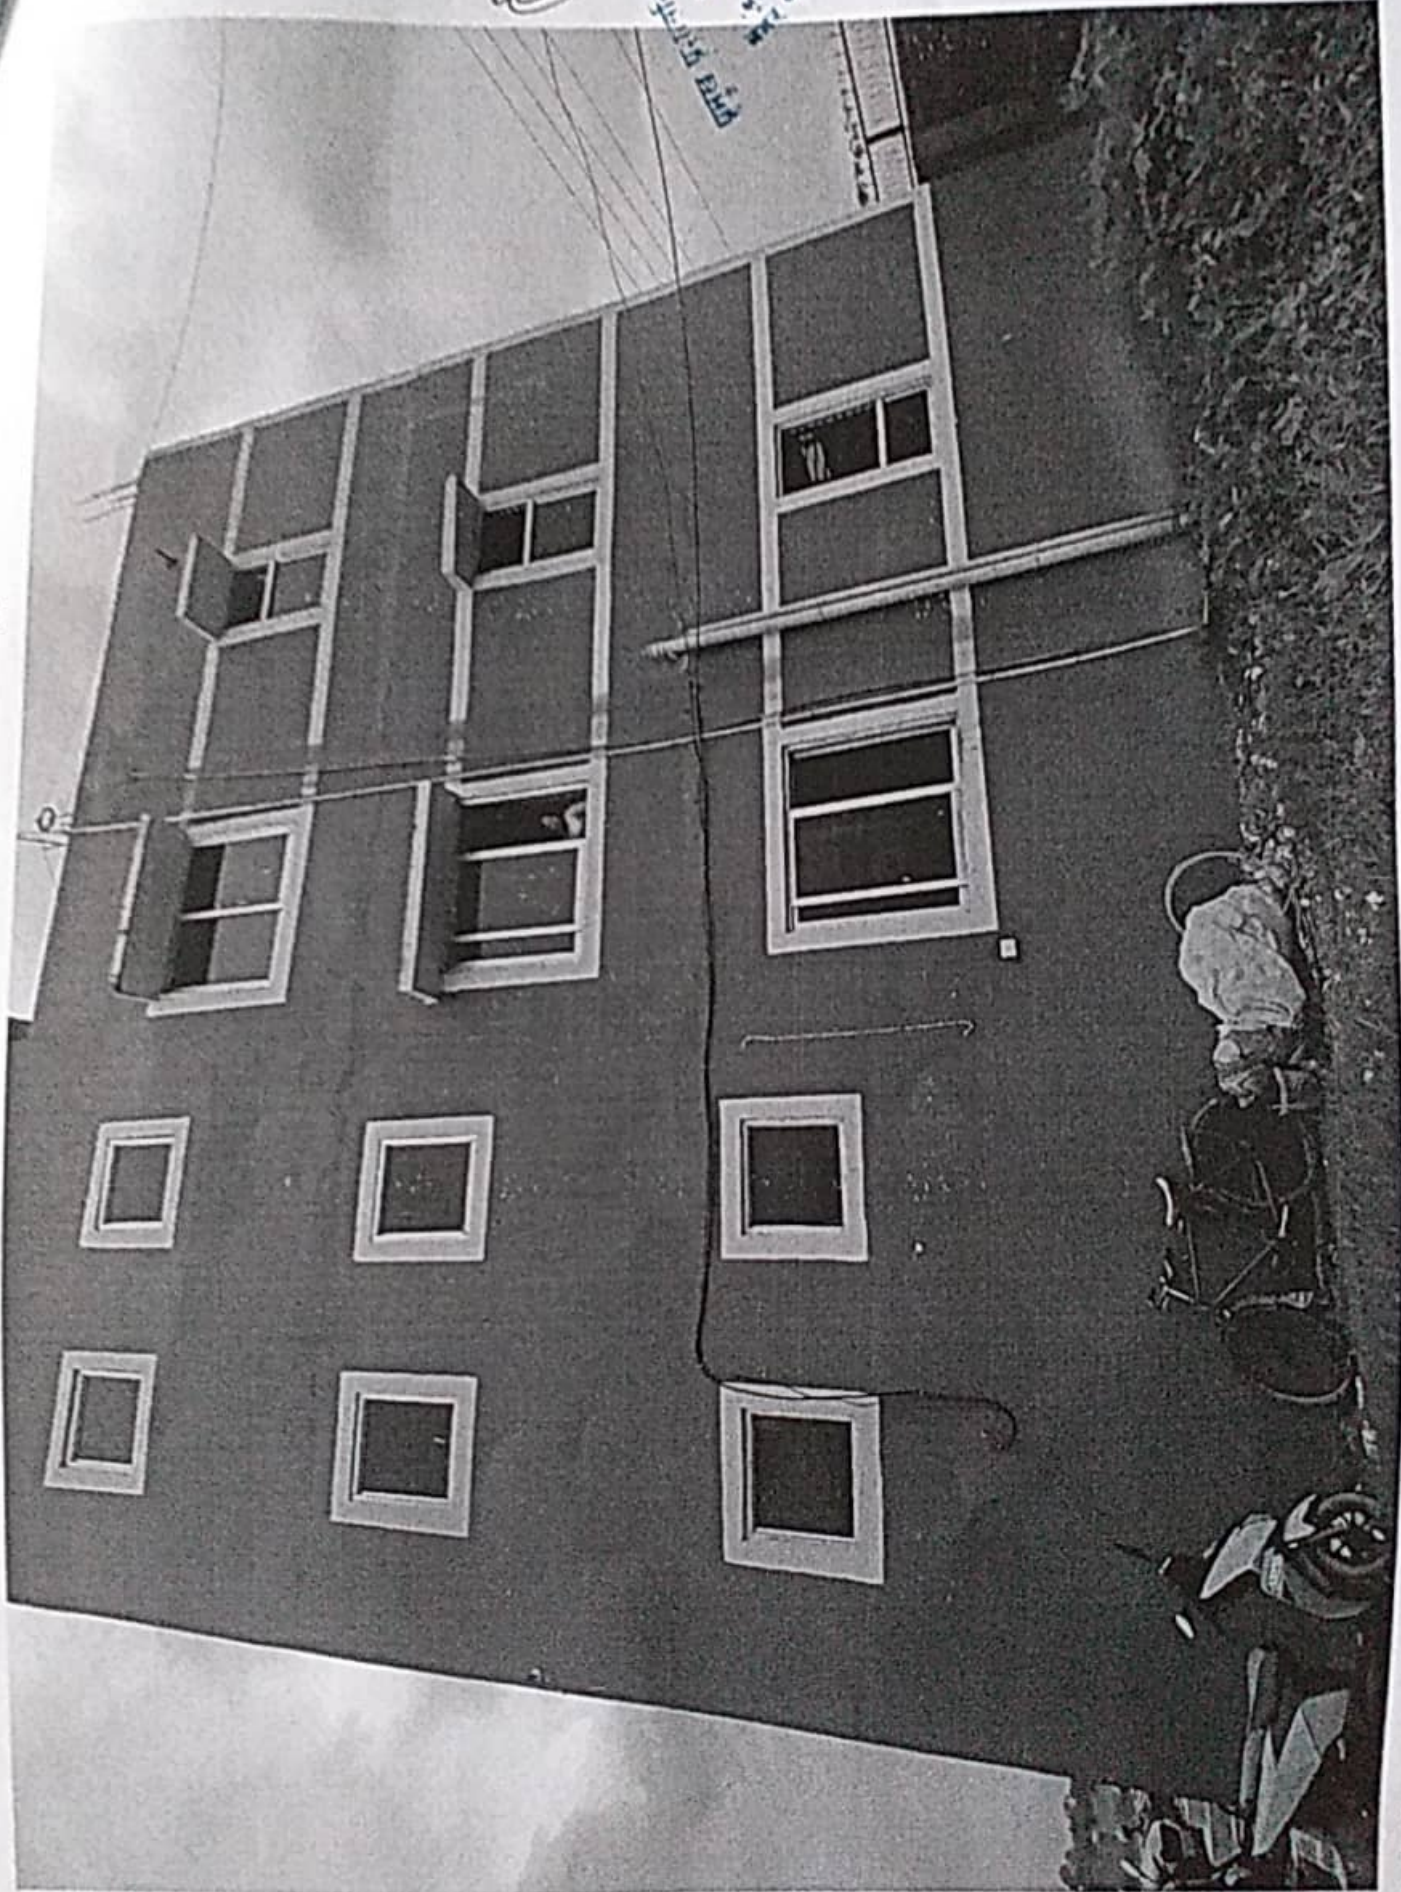

Handwritten signature and official stamps at the top of the page.

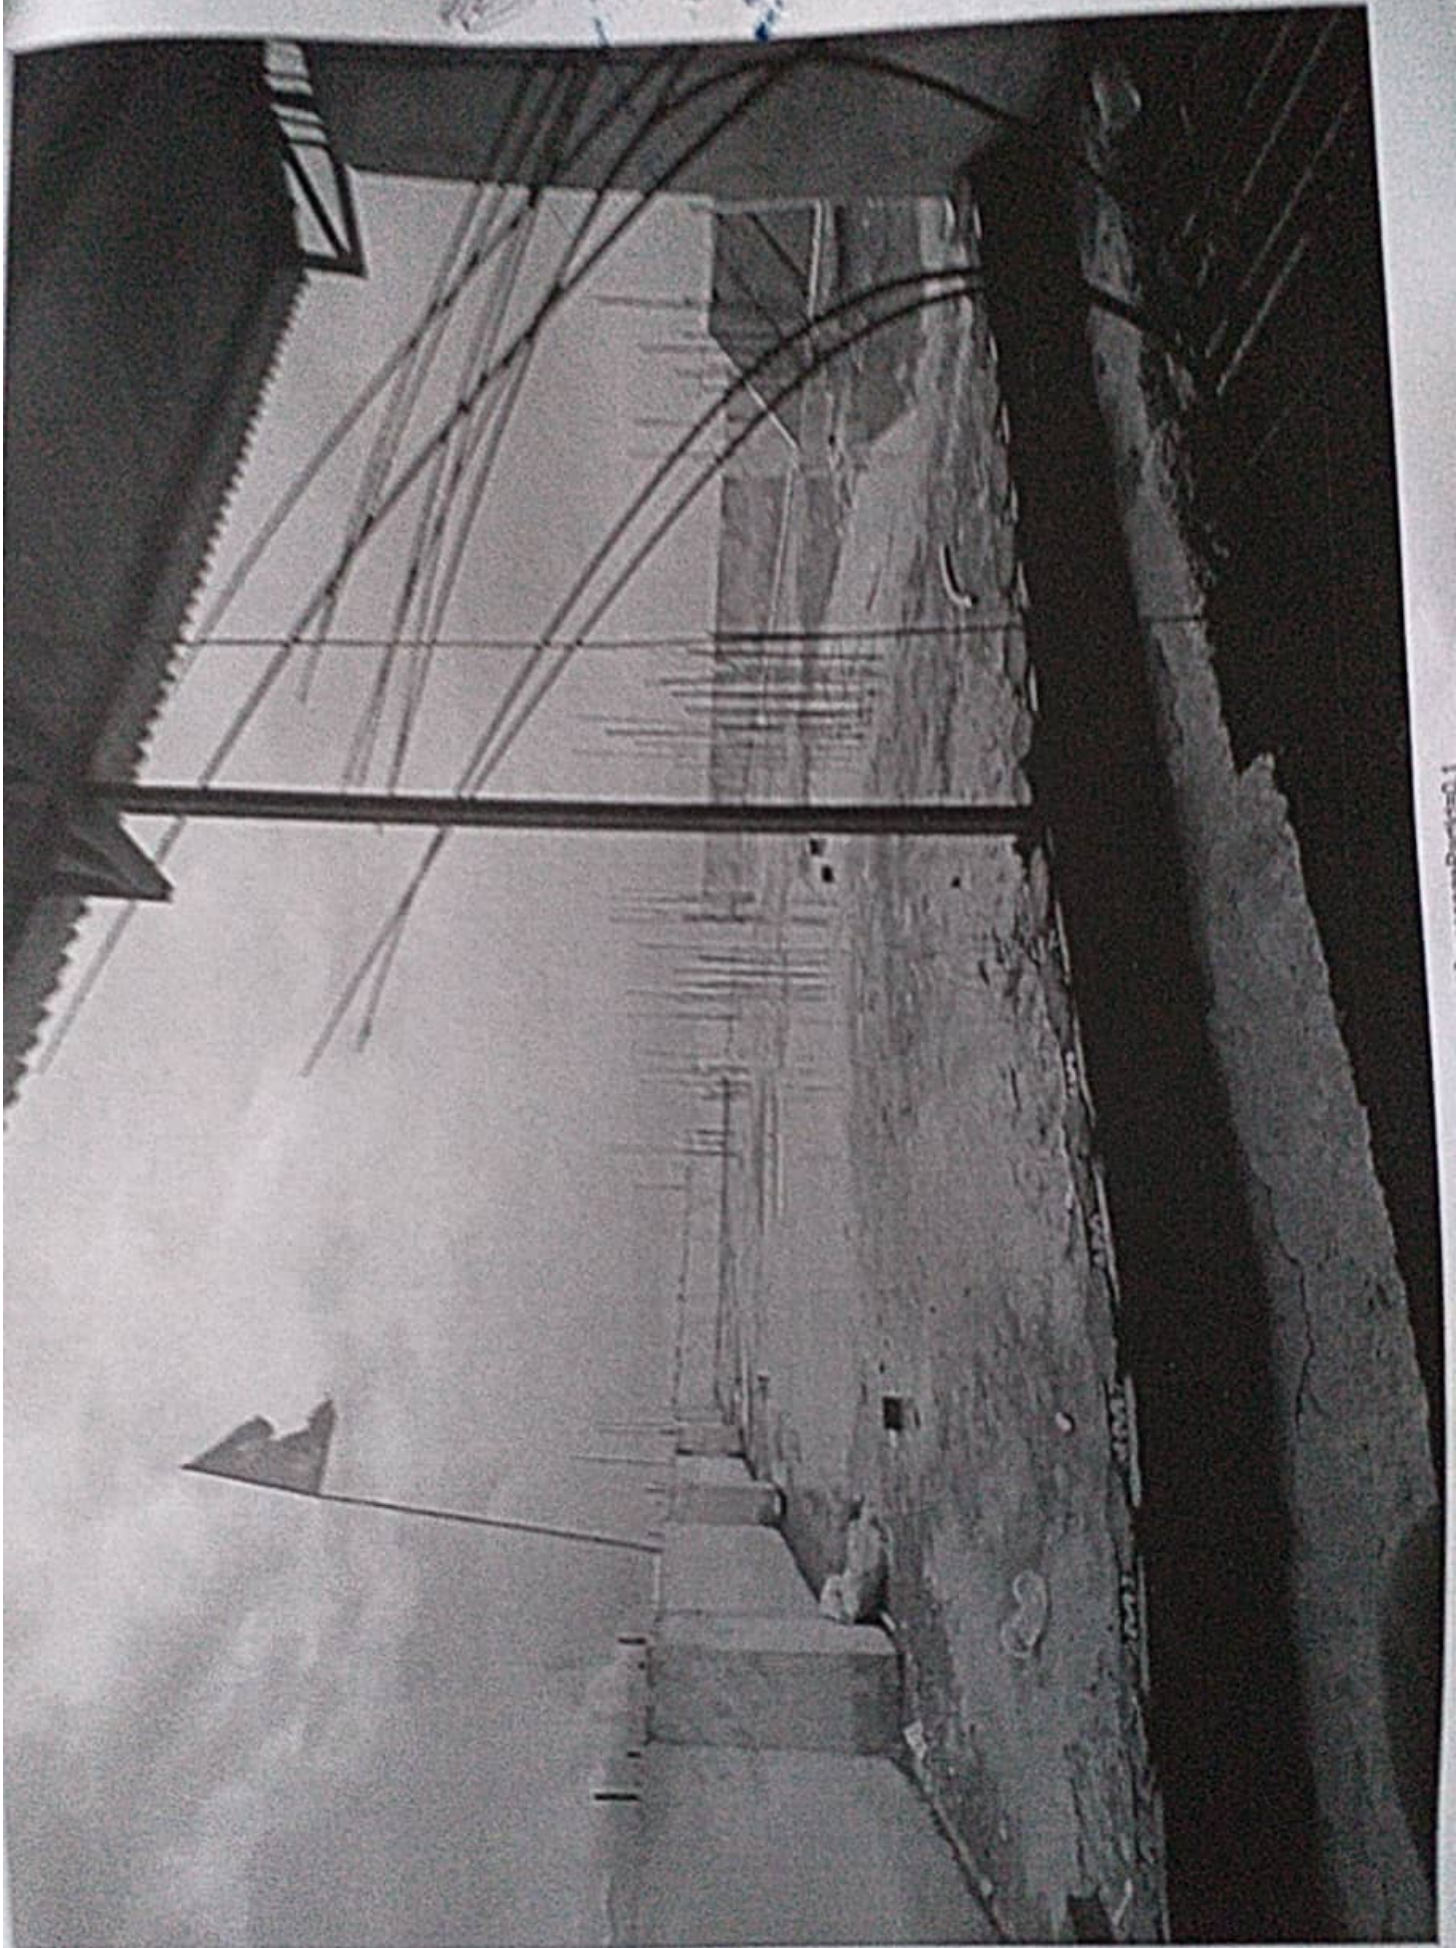


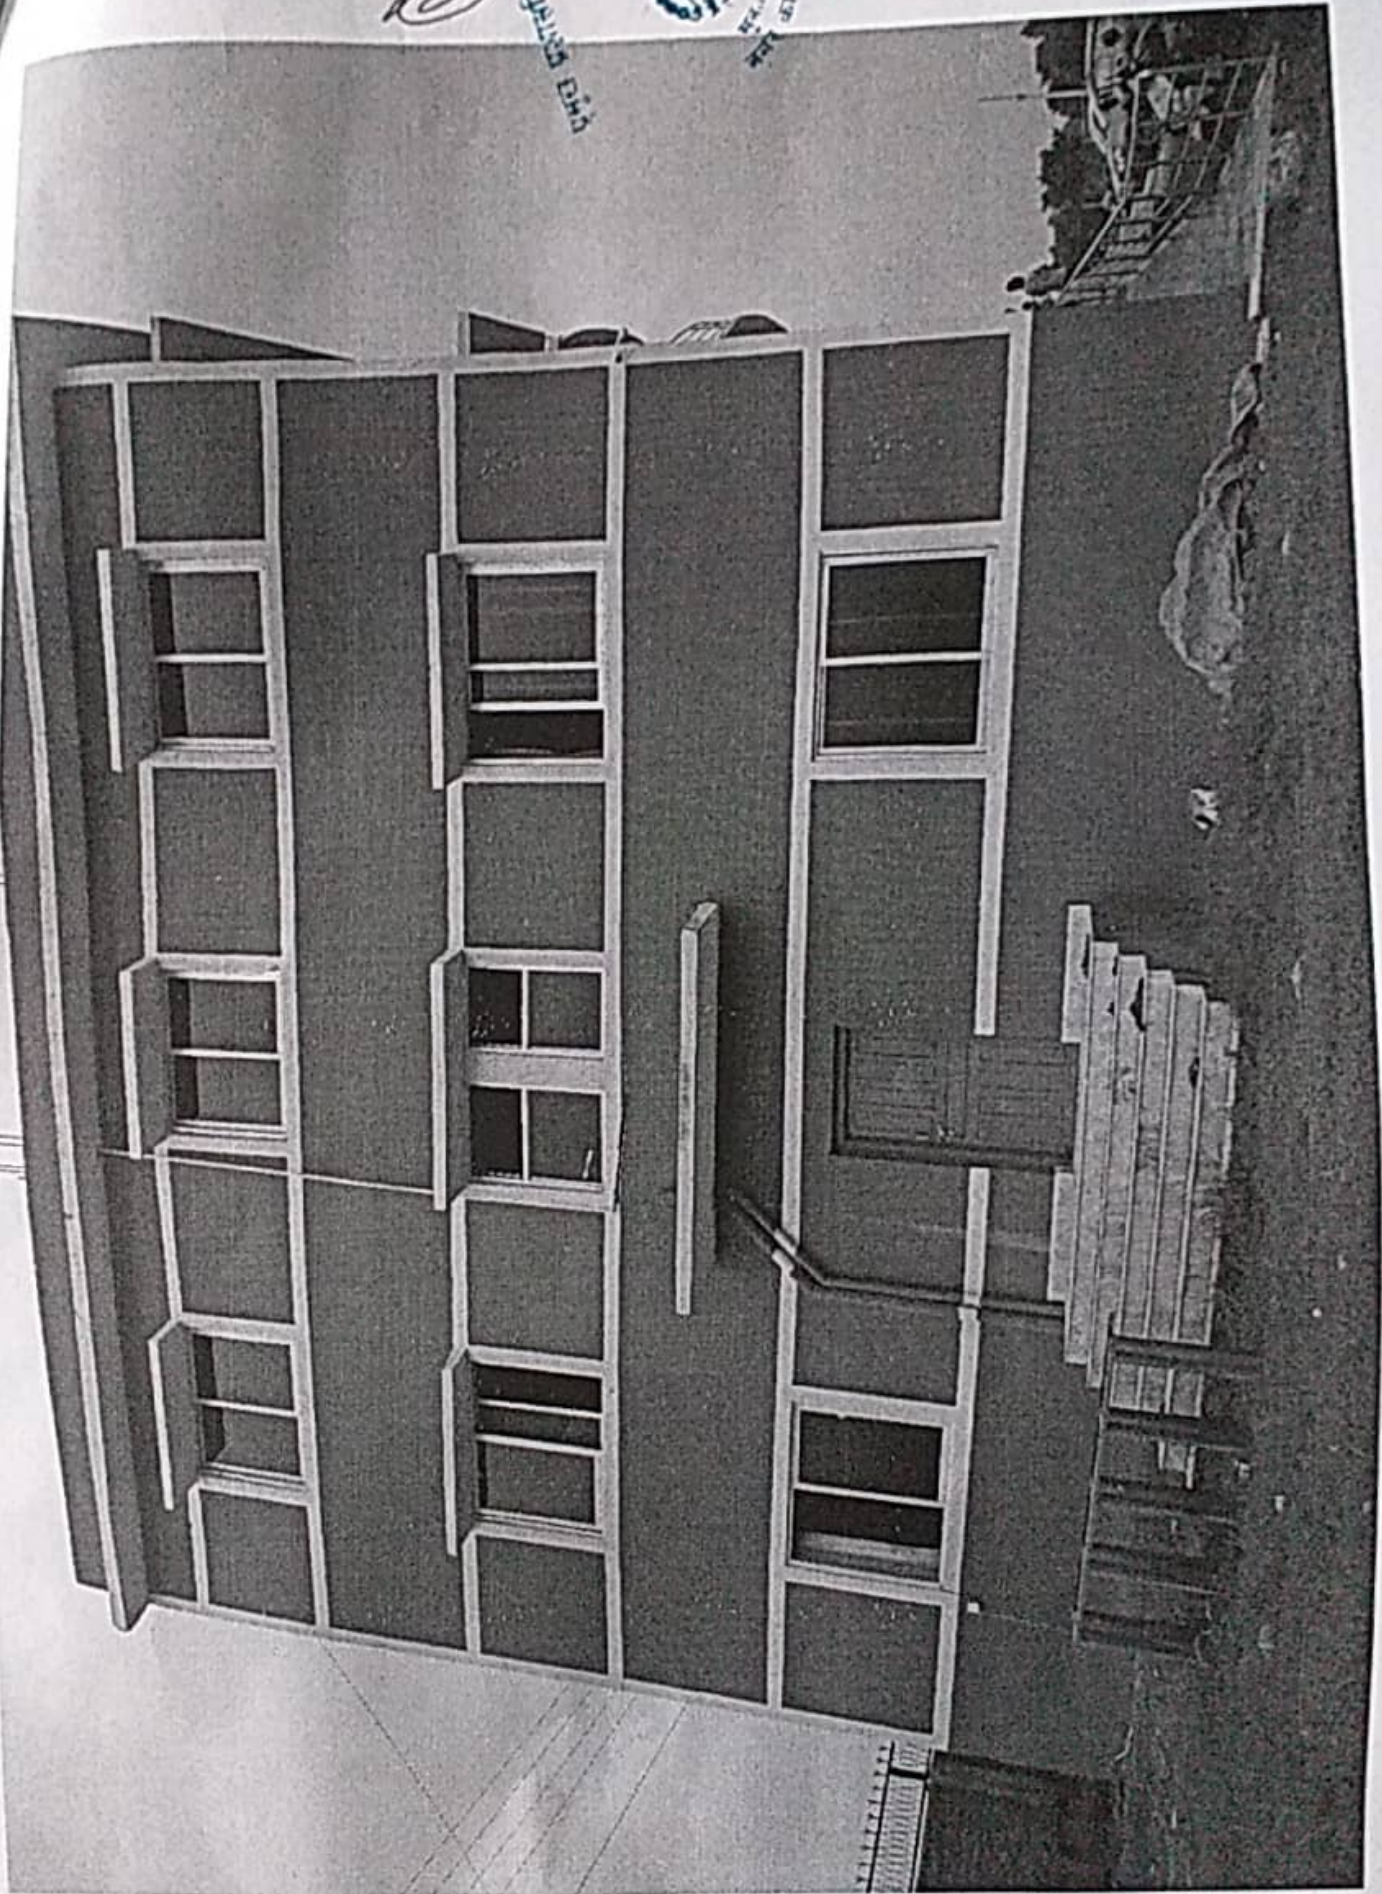

Handwritten signature and text in Urdu: "میرا نام ہے" (My name is)



Handwritten number "3" with a diagonal line through it.

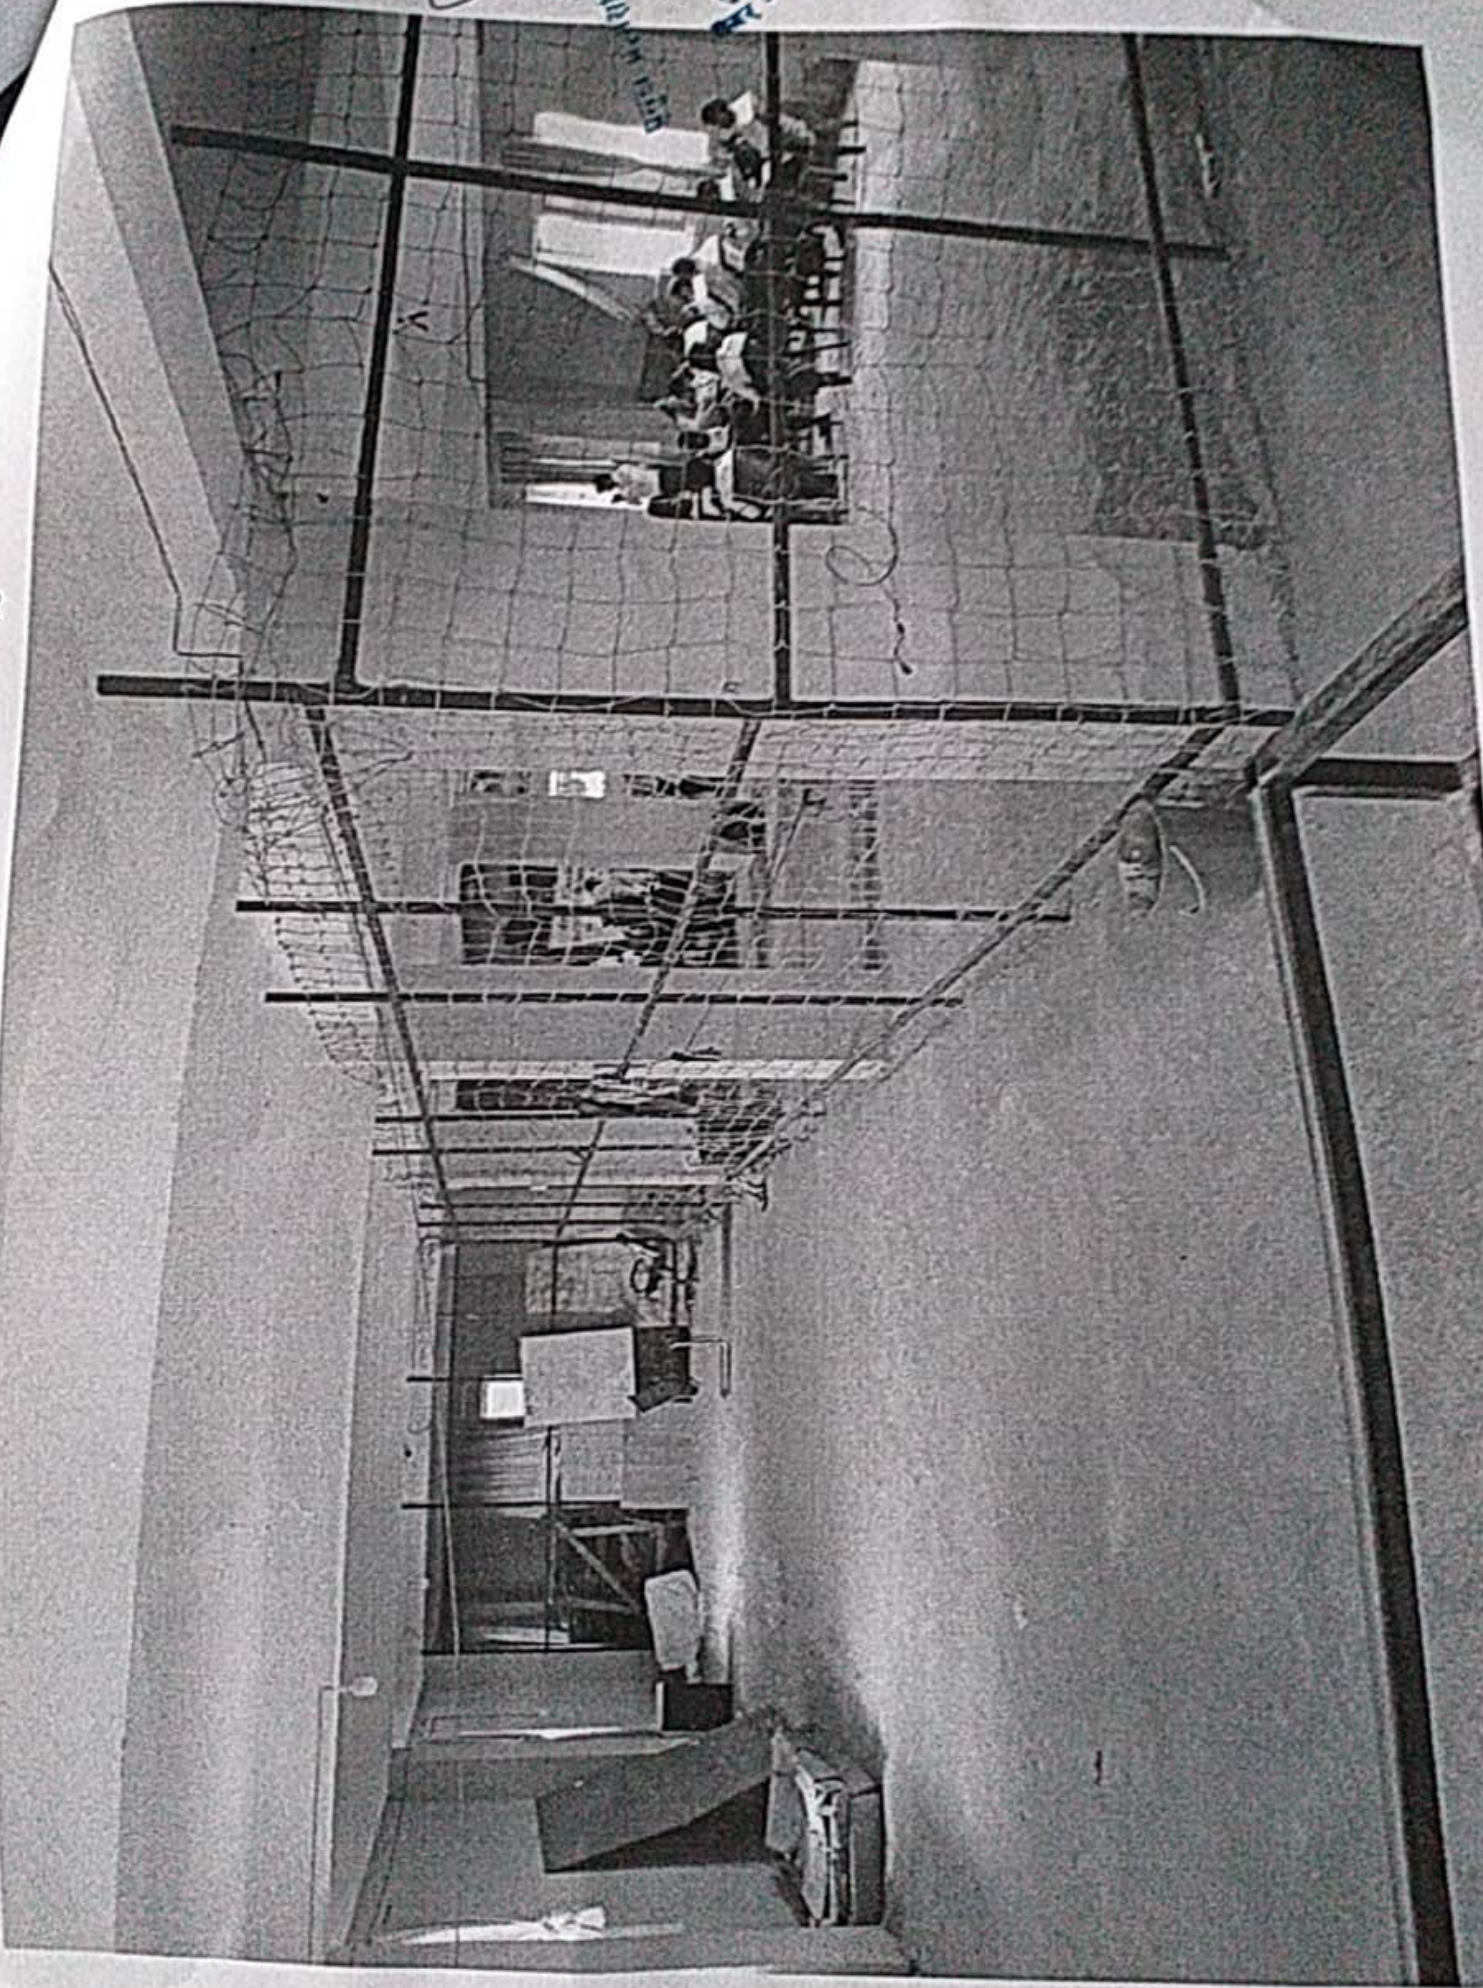

Handwritten signature and a circular official stamp are located at the top of the page, above the photograph.
